

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 17/04/2025

Inspecteur: Brahim Ichamrach

Mentor:

Installateur: Bestaande installatie

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel MI 3102
BT

Serienummer: 23120797

Datum verslag: 17/04/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Brouwerijstraat
Huisnummer 45
Busnummer
Postcode 8560
Gemeente WEVELGEM
Land België

Eigenaar

Naam Dhr & Mvr Van Reeth Ludo
Straatnaam Brouwerijstraat
Huisnummer 45
Busnummer
Postcode 8560
Gemeente WEVELGEM
Land België

Installateur

Naam Bestaande installatie
BTW nr. -
Telefoonnummer -
E-mail -

Type : woning

EAN : 541449611001176064

Teller Nr. : 1SAG3100202182

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 2

Aardelektrode: Aardingslus

Ri algemeen: 0.78 MΩ

OK

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 3N400V


Meter / bord verbinding: 16 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal kringen: 58

RE: 5.89 Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

ΔI (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{Δt}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
---------	--------	-----------------	-----------------	------	--------------------	------	-------

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Alle kringen	OK	OK
30	40		-	A	13	OK	OK
30	40		-	A	3	OK	OK
30	40		-	A	4	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	1	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	40		4	10
1	C	20		4	4
1	C	32		4	6
1	C	16		2	4
1	C	16		2	2,5
2	C	10		2	-
1	C	16		2	-
2	C	10		2	1,5
9	C	16		2	1,5
3	C	16		2	2,5
29	C	20		2	2,5
3	C	16		4	2,5

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 17/4/2050
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 16:20 tot 16:56

De inspecteur Brahim Ichamrach

Brahim Ichamrach
ACEG VZW - N305

De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 17/4/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.





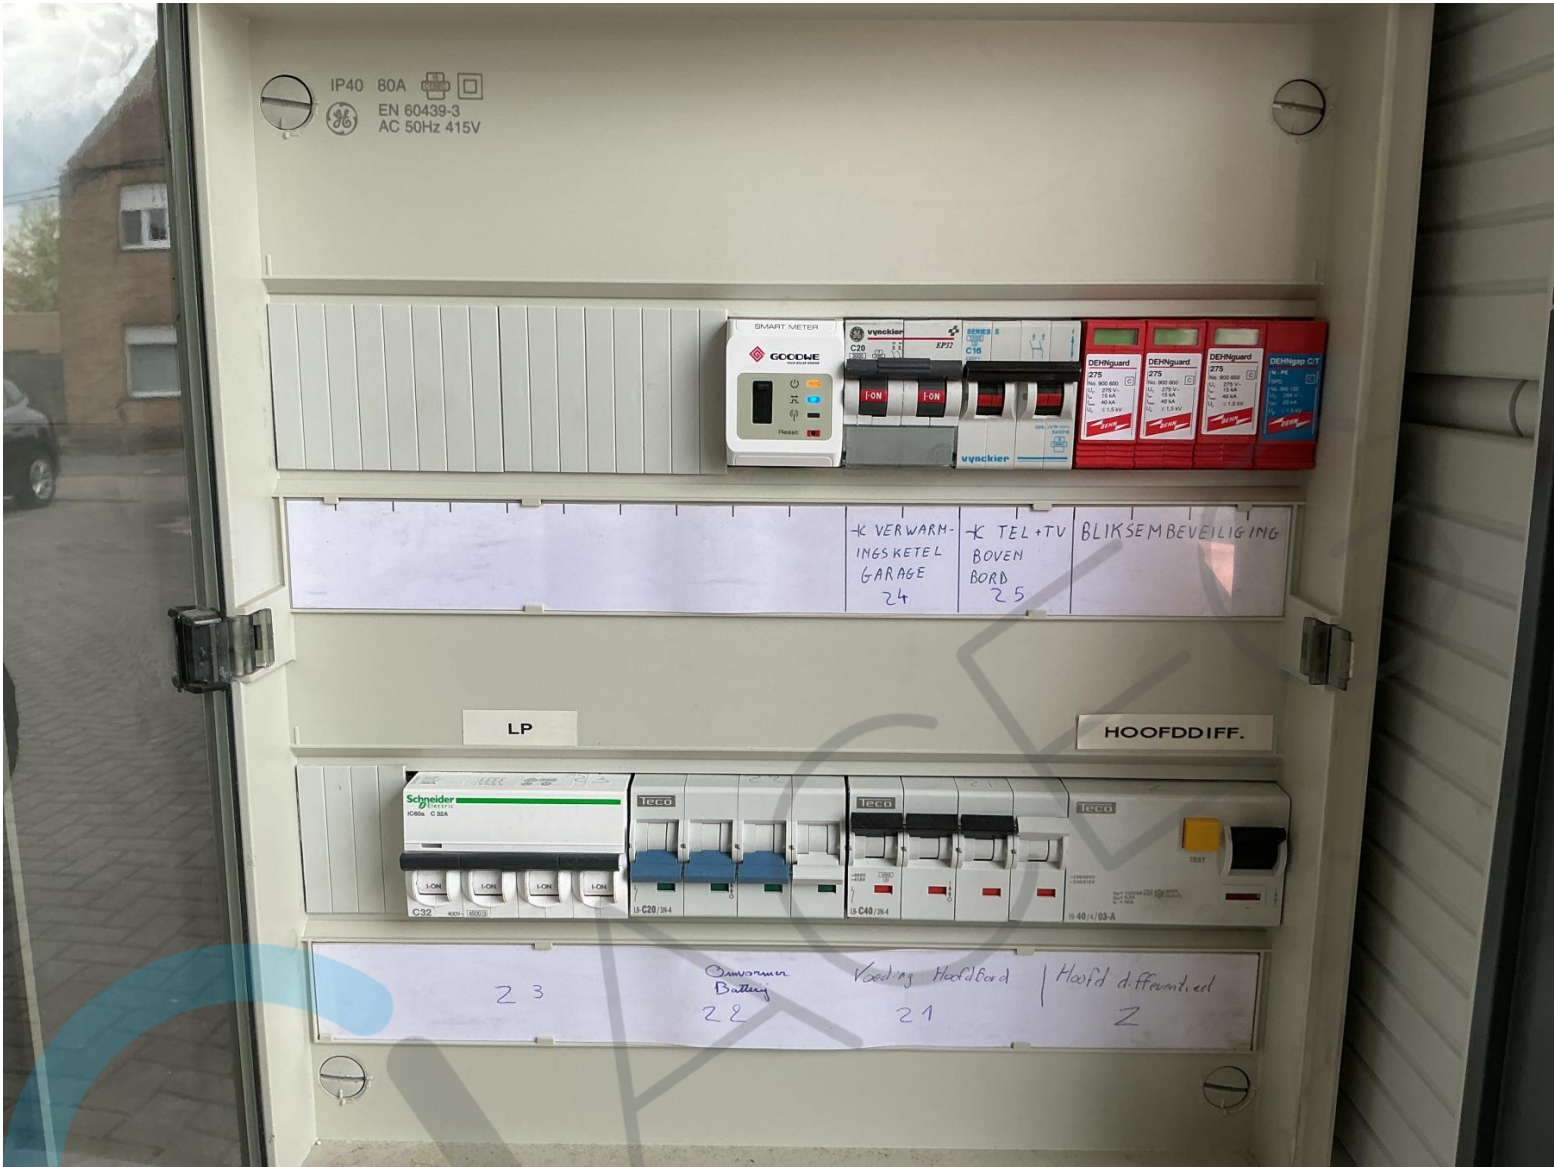



1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19

EENDRAADSCHEMA
Dhr & Mevr Van Reeth Ludo
Brouwerijstraat nr 45
8560 Wevelgem
tel nr 056/41.42.27

De afgevaardigde van het erkend organisme:

De verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk:

Colpaert Jan
Klijtberg 88 - 8570 Anzegem - Ingoelgem
BTW 770 055 482

Hykertz

SPACE
Brahmischamrach

Dhr & Mevr Van Reeth Ludo Wevelgem	Schaal:	Getek:	Colpaert
		Datum:	25/11/24
Eendraadschema		Onderwerp:	
			Blad: 1/16

